

EN EL PUEBLO DE SAN CRISTÓBAL TEXCALUCAN, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **12:30 HORAS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2024**, REUNIDOS LOS INTERESADOS EN EL LUGAR QUE SE INDICA, SE LEVANTA LA PRESENTE **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA** DE LA OBRA PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12.57, 12.58 Y 12.59 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 230 Y 232 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, LA **ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ**, DIRECTORA GENERAL, **LIC. SANDRA NAVA GARCÍA**, SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA, **ING. GONZALO VANEGAS VALÁZQUEZ**, SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN, EL **LIC. BENITO GARCÍA ÁVALOS**, POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y LA **C. ESTEFANÍA DE JESÚS SALAZAR ROJO**, POR SU PROPIO DERECHO, PROCEDEN A HACER CONSTAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA REALIZADA EN **EL PUEBLO DE SAN CRISTÓBAL TEXCALUCAN, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO**, CONSISTENTE EN: **"CONSTRUCCIÓN UNIDAD MEDICA EN EL PUEBLO DE SAN CRISTÓBAL TEXCALUCAN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO"**.

**RESPONSABLES DE LA OBRA:**

RESIDENTE DE OBRA: ING. ARQ. ARTURO GONZÁLEZ JUÁREZ  
SUPERVISOR DE OBRA: P. ING. BONIFACIO GERARDO NAVA ENTZANA  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: ING. ROGELIO SALAZAR QUINTANA

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:**

SE REALIZARON LOS TRABAJOS **PRELIMINRES** DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO CONTINUANDO CON EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACION DE ZANJAS SE REALIZA LA CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CAMIÓN DE VOLTEO Y ACARREO AL TIRO OFICIAL ASI PARA LA **CIMENTACIÓN** SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, EL SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DE VARILLA DEL NO 3 Y NO 4, CIMBRA Y DESCIMBRA POR MEDIOS MANUALES Y COLADO CON CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE CON UNA RESISTENCIA DE F'C=250 KG/CM2, SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE TRABE DE LIGA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM<sup>2</sup> Y RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRAVA ARENA 70-30 COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS FINALIZANDO ESTOS TRABAJO SE CONTINUO CON LA **ESTRUCTURA Y ALBAÑILERÍA** REALIZANDO LA IMPERMEABILIZACIÓN PARA DESPLANTE DE MUROS HASTA DE 40 CM DE ANCHO Y FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=150KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, CONTINUANDO CON EL MURO DE BLOCK DE CONCRETO MACIZO 14X20X40 CM DE 14 CM DE ESPESOR Y CONSTRUCCIÓN DE CASTILLOS CADENAS DE CERRAMIENTOS, TRABES DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE f'c= 250 kg/cm<sup>2</sup> REFORZADO CON VARILLA DEL No 2, No 3, No 4, No 5, FINALIZANDO CON EL COLADO DE LOSA DE 12 cm DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE f'c= 250 kg/cm<sup>2</sup> REFORSADA CON VARILLA No 3, POSTERIORMENTE SE COLOCO ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA LOSA DE ACCESO, SECCIÓN IRREGULAR DE 3.56X3.56M, A BASE DE PANEL W TIPO ESTRUCTURAL DE 4", SE CONTINUO CON EL ENTORTADO EN ÁREA DE AZOTEA PARA DAR PENDIENTE, A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 Y CHAFLAN CON SECCIÓN DE 15X15 CM DE CONCRETO SIMPLE DE F'c= 100KG/CM2. SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA 2 TINACOS DE 1,100 LT, DE CAPACIDAD, CON SECCIÓN DE 3.85x2.55 M Y 2.00 M DE ALTURA, SE REALIZO LA **INSTALACIÓN ELÉCTRICA** QUE CONSISTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 1" (25 MM), CABLE DE COBRE CAL.6 Y CAL.8, TUBO POLIFLEX DE 3/4" Y DE 1/2", TUBO CONDUIT DE PVC DE 3/4" Y CABLE DE COBRE CAL.10, CAL.12, ASI COMO INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 3X60A, CENTRO DE CARGA, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, LUMINARIA TIPO LED PLAFÓN, LUMINARIA EN PLANTA, LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO/EXTERIOR, LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO, APAGADOR SENCILLO Y

DOBLE EN MUROS, CONTACTO DUPLEX, SALIDA CONTACTO DOBLE NORMAL EN PISO, VARILLA COOPERWELD PARA CONEXION A TIERRA, REGISTRO ELÉCTRICO DE 0.40X0.60 M, CONSTRUCCIÓN DE NICHOS ELÉCTRICOS PARA TABLERO PRINCIPAL EN LA **INSTALACIÓN HIDRÁULICA** SE REALIZÓ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE CODOS, CONECTORES, COPLES, REDUCCIONES, DE 1 1/2", DE 1 1/4", DE 1", DE 3/4" Y DE 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WC, Y DE GABINETE CON LAVABO, LAVABO OVALYN, TARJA DE ACERO INOXIDABLE, MINGITORIO, BARRA RECTA DE 91.5 CM, DESPACHADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO, DESPACHADOR PLÁSTICO PARA TOALLAS DOBLADAS Y ESPEJO DECORATIVO, BOMBA PARA AGUA, ASÍ MISMO SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10,000 LT. EN LA **INSTALACIÓN SANITARIA** SE REALIZÓ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC SANITARIO DE 2,4 Y 6 DE DIÁMETRO, SE REALIZARON LAS BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, COLADERAS PARA PISO, DE PRETIL, DE CÚPULA PARA AZOTEA, SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA, POZO PARA CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES CON CAPACIDAD DE 18,750 LT Y FOSA SÉPTICA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO, SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE **VOZ Y DATOS** CON TUBO CONDUIT, CONECTORES DE 1" Y 3/4" DE DIÁMETRO. EN LOS **ACABADOS** SE REALIZÓ REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON ESTUCO EN MUROS, EN PLAFÓN Y BOQUILLAS, FALSO PLAFÓN DE PANEL TIPO ESTÁNDAR DE 13 MM. CAJILLO PERIMETRAL, FINALIZANDO CON APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y EN PLAFONES INTERIORES Y EXTERIORES. EN CONJUNTO SE REALIZÓ EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERÁMICO EN PISO, EN MUROS Y ZOCLOS. CONSTRUCCIÓN DE MESETA PARA RECIBIR LAVABO Y/O TARJA, FORRADO CON CERÁMICO Y SE REALIZÓ LA IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEA CON PRIMER BASE SOLVENTE. SE REALIZÓ LA **HERRERÍA Y CANCELERÍA** CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA, VENTANAS SECCIÓN VARIABLE Y PUERTAS A BASE PERFILES DE ALUMINIO, DE TAMBOR Y MELAMINA PLÁSTICA DE 6 MM, PUERTA METÁLICA A BASE DE PERFIL 2 1/2" X 1/8" Y PUERTA ACCESO PRINCIPAL EN DOS HOJAS. SE TRABAJÓ SIMULTANEAMENTE CON LA **OBRA EXTERIOR** DONDE SE REALIZÓ CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS, A BASE DE MURO DE BLOCK Y/O TABIQUE ROJO, COLOCANDO TIERRA VEGETAL PREPARADA PARA JARDINERÍA Y PASTO NATURAL TIPO ALFOMBRA Y PLANTAS DECORATIVAS DE ORNATO ASÍ MISMO SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ESTAMPADO PREMEZCLADO BOMBEABLE  $f'c=250$  kg/cm<sup>2</sup> SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE **RAMPA PARA MINUSVÁLIDOS** EN LA CUAL SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA A BASE DE PIEDRA DE MINA, SE REALIZÓ EL RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN FINALIZANDO CON LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE 10 CM DE ESPESOR Y FORJADO DE ESCALONES. SE REALIZARON TRABAJOS DE APERTURA EN CAJA, CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO A TIRO OFICIAL, CONTINUANDO CON EL AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, COLOCANDO BASE HIDRÁULICA, CONTINUANDO CON CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE 20 CM DE ESPESOR,  $f'c=250$  KG/CM<sup>2</sup> SE REALIZÓ EL CORTE Y CALAFATEO DE JUNTAS, SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA A BASE DE PIEDRA DE MINA, COLOCANDO DREN A BASE DE TUBERÍA PVC DE 7.5 CM DE DIÁMETRO, Y FILTRO DE GRAVA 3/4", FINALIZANDO CON LA LIMPIEZA GRUEZA Y FINA DE LA OBRA

**IMPORTE CONTRACTUAL**

MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	SALDO A CANCELAR
\$7,000,000.00	\$6,996,674.51	\$6,996,674.51	\$0.00





**RELACIÓN DE ESTIMACIONES**

No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	PAGADA	POR PAGAR
1 (UNO)	1,019,029.86	163,044.78	1,182,074.64	X	
2 (DOS)	492,844.10	78,855.06	571,699.16	X	
3 (TRES)	789,063.45	126,250.15	915,313.60	X	
4 (CUATRO)	1,208,703.36	193,392.54	1,402,095.90		X
5 (CINCO)	1,187,129.12	189,940.66	1,377,069.78		X
6 (SEIS) FINIQUITO	1,334,846.07	213,575.36	1,548,421.43		X
<b>TOTAL</b>			<b>6,996,674.51</b>		

**FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 20 DE AGOSTO DE 2023**  
**FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 29 DE DICIEMBRE DE 2023**  
**PERIODO DE EJECUCIÓN: 71 DÍAS**  
**FECHA DE INICIO REAL: 20 DE AGOSTO DE 2023**  
**FECHA DE TERMINO REAL: 29 DE DICIEMBRE DE 2023**

SE HACE CONSTAR, QUE LA **C. ESTEFANÍA DE JESÚS SALAZAR ROJO**, ENTREGA LOS PLANOS DEFINITIVOS EN FORMATO IMPRESO, LLAVES Y TODA LA DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SEÑALA QUE NO ES NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA, NI LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y DE SERVICIO DE LOS BIENES INSTALADOS.

UNA VEZ REALIZADA LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE E INSPECCIÓN FÍSICA, SE CONCLUYE QUE, LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN **"CONSTRUCCIÓN UNIDAD MEDICA EN EL PUEBLO DE SAN CRISTÓBAL TEXCALUCAN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO"**, UBICADA EN EL PUEBLO DE SAN CRISTÓBAL TEXCALUCAN, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA.

**GARANTÍA**

FIANZA	NO. DE FIANZA	AFIANZADORA	MONTO
POR DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE PUDIERA PRESENTAR LA OBRA, QUE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE UN AÑO.	2895390	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	\$699,667.45

POR TAL MOTIVO, **EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN**, RECIBE LA OBRA PÚBLICA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA Y DE CONFORMIDAD, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, (MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, COMO PAGOS INDEBIDOS, VICIOS OCULTOS O LO QUE PUDIERA RESULTAR IMPUTABLE AL CONTRATISTA), SIENDO PROCEDENTE LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, AL HABER CUMPLIDO LA CONSTRUCTORA CON LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, QUEDANDO SUBSISTENTES LAS



OBLIGACIONES POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ADQUIRIDA POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

POR OTRO LADO, EN VIRTUD DE QUE LA OBRA PÚBLICA CONTRATADA **"CONSTRUCCIÓN UNIDAD MEDICA EN EL PUEBLO DE SAN CRISTÓBAL TEXCALUCAN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO"** SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA SU FUNCIONAMIENTO, EN ESTE ACTO, LA **ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ, DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN,** HACE ENTREGA FORMAL A LA **LIC. MA GUADALUPE ROSAS HERNÁNDEZ, DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, DENOMINADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,** EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, **QUIEN RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA PÚBLICA EN MENCIÓN.**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA Y PREVIA SU LECTURA Y RATIFICACIÓN, SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE POR TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPAN, PARA LA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A 06 DE MARZO DE 2024.

**POR EL MUNICIPIO**



ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ  
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN



LIC. SANDRA NAVA GARCÍA  
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA



ING. GONZALO VANEGAS VELÁZQUEZ  
SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN



ING. ARQ. ARTURO GONZÁLEZ JUÁREZ  
RESIDENTE DE OBRA



P. ING. BONIFACIO GERARDO NAVA ENTZANA  
SUPERVISOR DE OBRA



**POR EL CONTRATISTA**

C. ESTEFANÍA DE JESÚS SALAZAR ROJO  
POR SU PROPIO DERECHO

ING. ROGELIO SALAZAR QUINTANA  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

**TESTIGO DE ASISTENCIA**

LIC. BENITO GARCÍA AVALOS  
POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

**QUIEN RECIBE LA OBRA PÚBLICA**

LIC. MA GUADALUPE ROSAS HERNANDEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO,  
DENOMINADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**POR LA COMUNIDAD**

C. DELFINO MÁRQUEZ GONZÁLEZ

C. FELFINO MÁRQUEZ GONZÁLEZ  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
DE EL PUEBLO DE SAN CRISTÓBAL TEXCALUCAN



**POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

C. MARTHA HIGINIA JIMÉNEZ GUTIÉRREZ  
CONTRALOR SOCIAL A

C. JAQUELINE SÁNCHEZ ENTZANA  
CONTRALOR SOCIAL B

C. FRANCISCO MIRELES LÓPEZ  
CONTRALOR SOCIAL C

**POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA  
DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**

NOMBRE Y FIRMA

**POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA DEL  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**

NOMBRE Y FIRMA

**POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**

NOMBRE Y FIRMA






EN EL PUEBLO DE SAN CRISTÓBAL TEXCALUCAN, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **12:30 HORAS DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2024**, LA **ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ**, DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, LA **LIC. MA. GUADALUPE ROSAS HERNÁNDEZ**, DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, DENOMINADO **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA** Y LA **C. ESTEFANÍA DE JESÚS SALAZAR ROJO**, POR SU PROPIO DERECHO, PROCEDEN A HACER CONSTAR LA ENTREGA DE LLAVES A EL AREA ENCARGADA DE SU OPERACIÓN, CONSISTENTE EN: **"CONSTRUCCIÓN UNIDAD MEDICA EN EL PUEBLO DE SAN CRISTÓBAL TEXCALUCAN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO"**, EN EL PUEBLO DE SAN CRISTÓBAL TEXCALUCAN, HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO.

NÚMERO DE PUERTA	ESPACIOS	PIEZA DE LLAVES
1	ACCESO	6
2	TRABAJO SOCIAL	2
3	ARCHIVO CLÍNICO	2
4	SALIDA RPBI	2
5	CURACIONES	2
6	CONSULTORIO 1	2
7	CONSULTORIO 2	2
8	CONSULTORIO DENTAL	2
9	VESTIDORES	2
10	B.MPAL	2
11	RPBI	2
12	CONSULTORIO GINECOLÓGICO	2
13	CONSULTORIO 3	2
14	SÉPTICO	2
15	BODEGA	2
<b>TOTAL DE LLAVES</b>		<b>34 LLAVES</b>

ACCESORIOS	DESCRIPCION	PIEZA DE LLAVES
16	CANDADO DE NICHOS ELECTRICOS	2
17	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL	22
18	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO	8
19	CANDADO DE ACCESO VEHICULAR	2

4



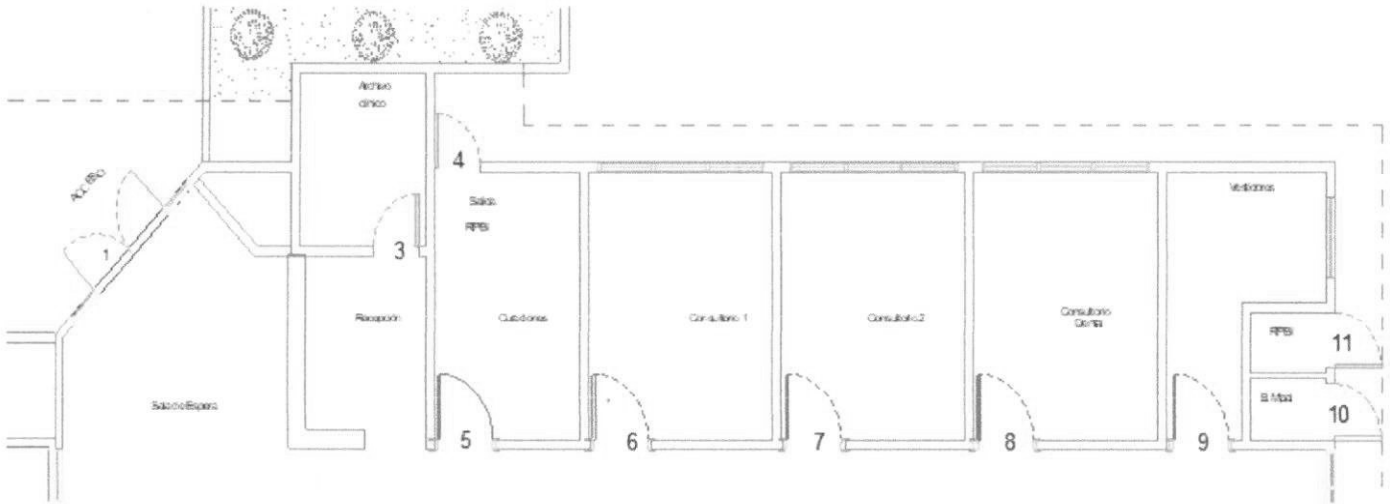

QUIEN RECIBE

**DCIE**  
 HUIXQUILUCAN  
 2024  
**DIRECCIÓN GENERAL**

LIC. MA. GUADALUPE ROSAS HERNÁNDEZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO,  
 DENOMINADO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

